MESYUARAT KICK-OFF

PROJECT / PRABN / 2026

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

KICK-OFF PROJEK

KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT TRANSIT PUSAT RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA (PRABN) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI IBU PEJABAT JPS MALAYSIA, CYBERJAYA, SELANGOR

NO. KONTRAK	TARIKH	TEMPAT
JPS/IP/SH/BBI/01/2026	05 November 2026	Bilik Mesyuarat, Aras 4, Blok B Ibu Pejabat JPS Cyberjaya

Jumlah Kontrak	Tempoh	Milik Tapak	Serahan
RM 891,000	5 Bulan	13 Nov 2026	12 Apr 2027
Harga kontrak rasmi	107 hari kerja	Mula pelaksanaan	Hand over projek

PEMILIK · JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

KONTRAKTOR · ANSAR TECHNOLOGIES SDN BHD

RENOVASI

MEKANIKAL

ELEKTRIKAL

ICT & VIDEO WALL

MEETING.FLOW / 10 CHECKPOINTS

Agenda Mesyuarat

Aliran keputusan daripada taklimat projek hingga kesiapsiagaan mobilisasi

01 **Taklimat Projek**
Skop, operasi & tadbir urus

02 **Cadangan Pelaksanaan**
Pendekatan kontraktor

03 **Bon Pelaksanaan**
WJP dan nilai rasmi

04 **Insurans**
CAR & Public Liability

05 **PERKESO**
Kod majikan & caruman

06 **Program & Kaedah**
Gantt, tempoh & kawalan

07 **Carta Organisasi**
Pasukan projek & SSS

08 **Wakil Tapak**
Pelantikan rasmi

09 **Papan Tanda**
Format & kelulusan JPS

10 **NSC & Kompetensi**
Sijil syarikat & personel

MEETING.OUTPUT

- **Keputusan JPS**
- **Dokumen kontraktor**
- **Tindakan mobilisasi**

01

Taklimat Projek oleh Pemilik Projek

Cadangan rangka perkara untuk disahkan oleh JPS semasa mesyuarat

FOKUS

Selamat Tersusun Minimum gangguan

Hasil akhir: ruang berfungsi, sistem diuji dan dokumentasi lengkap

SESI JPS

A Skop & hasil projek

- Sempadan kerja dan ruang terlibat
- Keperluan fungsi ruang PRABN
- Kriteria penerimaan dan serahan

B Operasi & akses tapak

- Waktu kerja dan akses keselamatan
- Urutan pemindahan ruang transit
- Kawalan bunyi, habuk dan laluan

C Tadbir urus projek

- Pegawai penguasa dan saluran arahan
- Kelulusan bahan / shop drawing
- Kekerapan mesyuarat dan laporan

KEPUTUSAN DIPERLUKAN

- ✓ Tarikh milik tapak
- ✓ Akses pekerja
- ✓ Zon kerja
- ✓ Urutan pemindahan
- ✓ Waktu kerja
- ✓ Tempoh kelulusan bahan

01

Ringkasan Kontrak

Maklumat disahkan melalui Surat Setuju Terima dan Lampiran A kontrak

NAMA PROJEK

KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT TRANSIT PUSAT RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA (PRABN) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI IBU PEJABAT JPS MALAYSIA, CYBERJAYA, SELANGOR

NO. KONTRAK

JPS/IP/SH/BBI/01/2026

SST: 27 Oktober 2026

DISAHKAN MELALUI SST

JUMLAH KONTRAK

RM 891,000.00

TARIKH MILIK TAPAK

13 Nov 2026

TARIKH SERAHAN

12 Apr 2027

TEMPOH

5 bulan

PIHAK & TERMA UTAMA

PEMILIK PROJEK	KONTRAKTOR	LAD	LOKASI
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia	Ansar Technologies Sdn Bhd	RM161.27 / hari	Ibu Pejabat JPS Malaysia, Cyberjaya, Selangor

02

Cadangan Pelaksanaan Projek

Pelaksanaan berfasa selama lima bulan sambil mengekalkan operasi pejabat

01

Persediaan

Ukur, foto, utiliti, akses dan program kerja

02

Isolasi & Transfer

Lindung aset, asing zon dan pindah secara terkawal

03

Binaan Berzon

Kerja buka, binaan, kemasan dan M&E berzon

04

Integrasi Sistem

ICT, video wall, pelabelan dan ujian

05

Serahan & DLP

Defect list, as-built, O&M, waranti dan serahan

SASARAN PELAKSANAAN

01 Operasi diteruskan

Pejabat kekal beroperasi; kerja mengganggu dibuat pada masa diluluskan.

02 Pematuhan teknikal

Kerja menurut BQ, lukisan, spesifikasi dan bahan yang diluluskan.

03 Lindungi pengguna & aset

Kakitangan, orang awam, dokumen dan aset kerajaan diasing serta dilindungi.

04 Jejak dokumentasi

Kelulusan, foto, pemeriksaan, ujian, perubahan dan serahan direkodkan.

02

Skop Kerja dalam Projek

Ringkasan daripada Cadangan Pelaksanaan; skop muktamad tertakluk BQ, lukisan dan spesifikasi

A Awalan & Mobilisasi

Pemeriksaan bersama, pengukuran, foto keadaan asal, perlindungan aset, permit dan pengasingan kawasan.

B Buka & Perobohan

Semak servis tersembunyi, buka komponen diluluskan, kawal sisa dan bersihkan kawasan setiap hari.

C Transfer & Installation

Pindah partition, workstation, carpet, roller blind dan aset dari stor JPS Blok D secara berinventori.

D Renovasi Blok A

Aras 5, Sayap Kanan: kerja binaan dalaman, kemasan, perkhidmatan dan penyelarasan ruang transit.

E Renovasi Blok D

Aras G, Tadika: ubah suai ruang, kemasan dan sistem berkaitan mengikut zon diluluskan.

F Seni Bina & Kemasan

Partition, pintu, siling, lantai, cat, kabinet, kaunter, perabot terbina dan papan tanda.

G Mekanikal & Elektrikal

Lampu, soket, pendawaian, papan agihan, penyaman udara, pengudaraan, ujian dan pentauliahan.



H ICT & Video Wall

Pindah rangka dan peralatan video wall dari JPS Ampang, integrasi rangkaian, label dan ujian.

02

Strategi Zon & Urutan Kerja

Pembahagian akhir disahkan selepas lawatan tapak dan penyelarasan operasi JPS

Pisahkan pengguna, laluan dan aktiviti pembinaan

ZON 1

Blok D • Aras G • Tadika

- Rekod keadaan asal, ukuran dan aset
- Pengasingan kawasan serta laluan selamat
- Renovasi + M&E + elektrikal + ICT
- Pemeriksaan keselamatan dan pelepasan zon

ZON 2

Blok A • Aras 5 • Sayap Kanan

- Selaras ruang transit dan pemindahan aset
- Kerja mengganggu pada waktu diluluskan
- Renovasi + M&E + elektrikal + ICT
- T&C, snagging dan serahan ruang

Ukur › **Lindung** › **Buka / pindah** › **Pasang** › **Uji** › **Serah**

06

Kaedah Kerja

Aliran kerja Cadangan Pelaksanaan dengan kelulusan, pemeriksaan dan rekod pada setiap peringkat

01 Mobilisasi & Rekod Awal

Mesyuarat • ukur bersama • foto asal • semak utiliti, akses, stor, sisa & laluan kecemasan

PENGESAHAN TAPAK

02 Pengasingan & Operasi

Barrier • signage • kawalan habuk • lindung aset • kerja mengganggu pada waktu diluluskan

KELULUSAN JPS

03 Buka & Pindah

Semak servis tersembunyi • inventori • label • buka terkawal • laluan sisa diluluskan

HOLD POINT

04 Bina & Pasang

Setting-out • sampel / katalog • bahan diluluskan • koordinasi seni bina, M&E dan ICT

CONCEALED WORKS

05 Uji, Periksa & Pulih

T&C • pemeriksaan dalaman / bersama • defect list • pembaikan • pembersihan & pelepasan zon

REKOD KEPUTUSAN

06 Serahan & DLP

As-built • O&M • sijil ujian • waranti • kunci / kad akses • sokongan Tempoh Tanggungan Kecacatan

DOKUMEN SERAHAN

Program Kerja Terperinci

Program wajib daripada JPS CYBERJAYA.pdf • 13 November 2026 hingga 12 April 2027

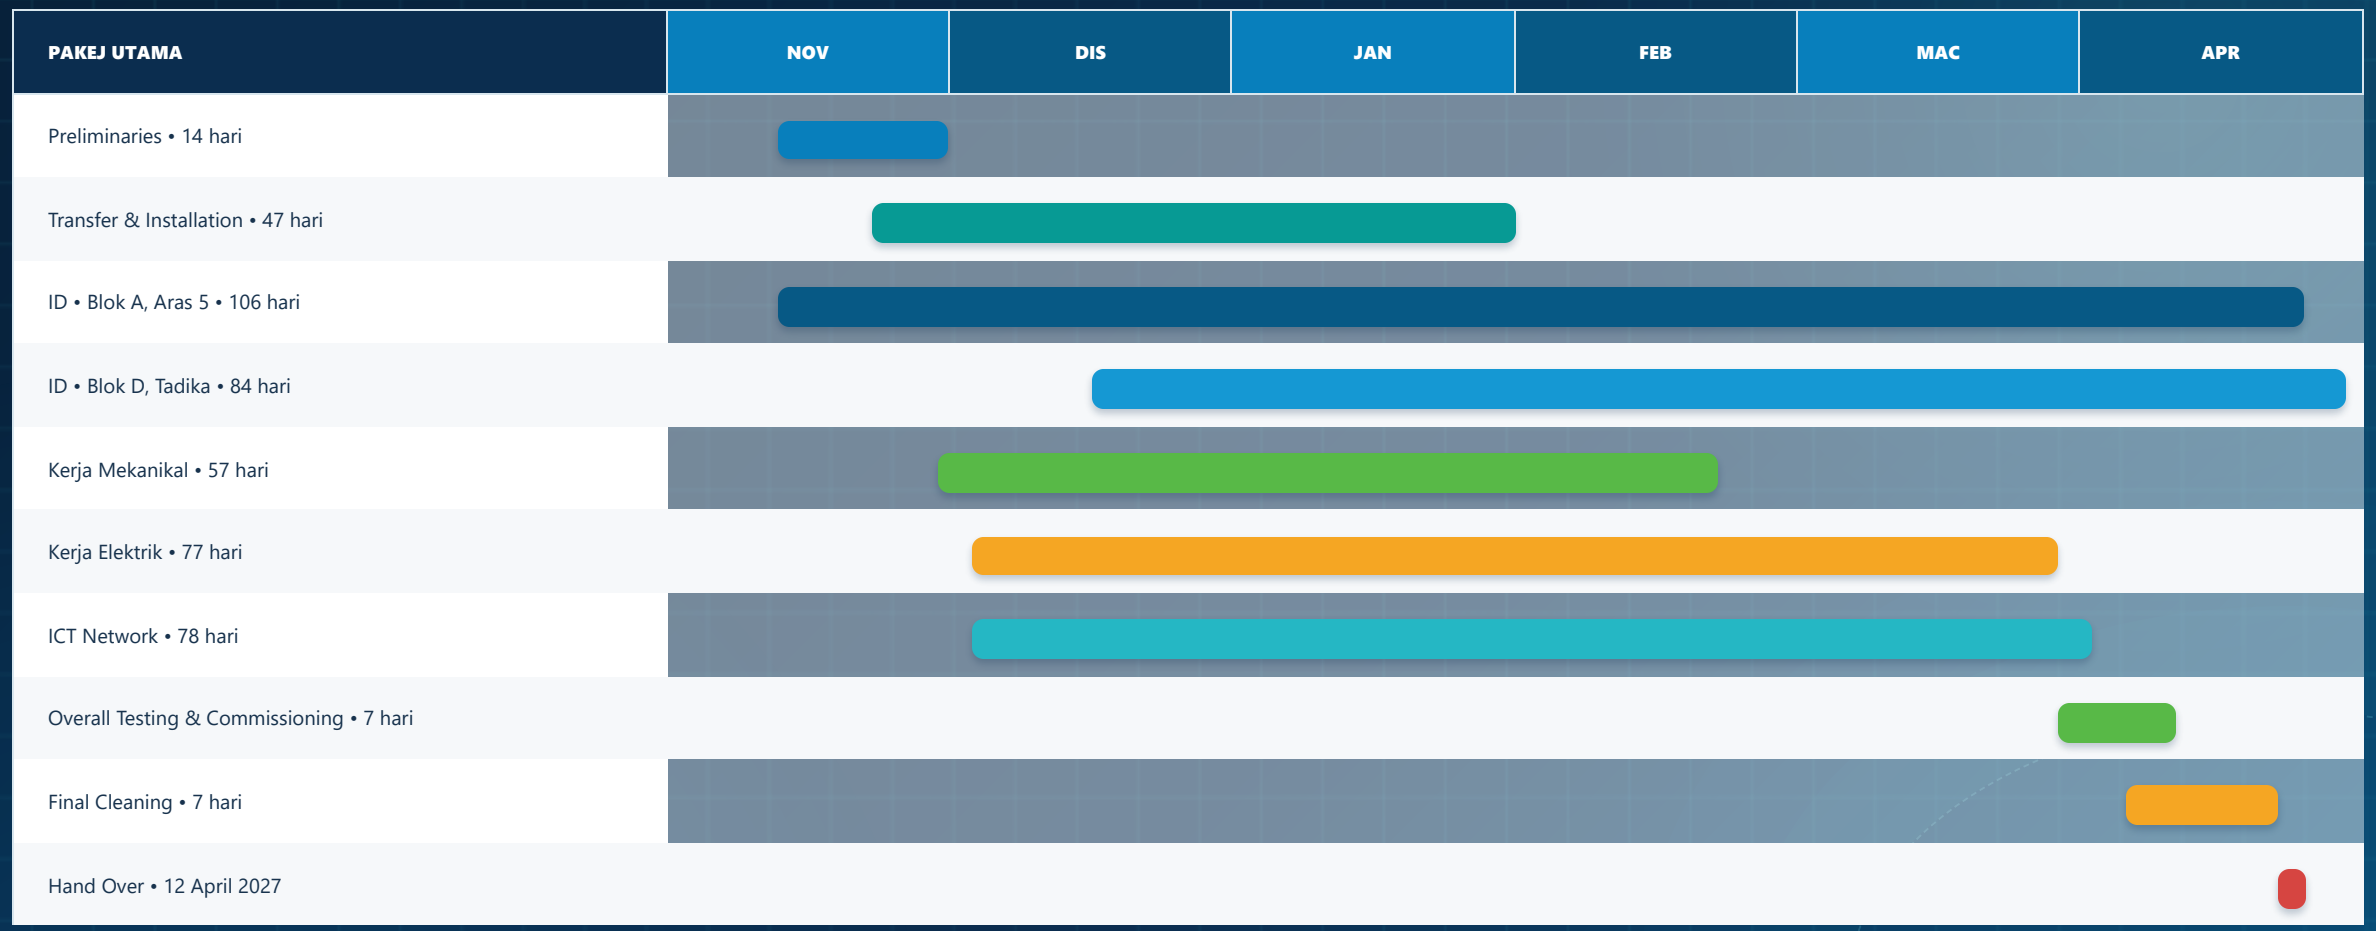

MILESTONE UTAMA

- Mula 13 Nov
- Transfer 27 Jan
- T&C 6 Apr
- Serah 12 Apr

PROGRAM DITERIMA

06

Kawalan Keselamatan, Mutu & Operasi

Kawalan utama sepanjang pelaksanaan di bangunan yang sedang beroperasi

HSE

Keselamatan & Alam Sekitar

- JSA / HIRARC, PPE, permit dan penyeliaan
- Laluan kecemasan serta alat kebakaran sentiasa bebas
- Habuk, bunyi, bau dan sisa dikawal; sisa ke lokasi dibenarkan

QA

Kawalan Kualiti

- Sampel, katalog, data teknikal dan bahan diluluskan
- Periksa bahan masuk, kerja proses dan concealed works
- NCR, tindakan pembetulan, ujian dan penutupan direkodkan

OPS

Kesinambungan Operasi

- Pengguna, laluan dan zon binaan diasingkan
- Notis awal bagi gangguan utiliti, ICT atau pemindahan
- Kerja bising / berhabuk dibuat pada masa yang diluluskan

DOC

Rekod & Kelulusan

- Program, material schedule, method statement dan checklist
- RFI, arahan bertulis, perubahan, foto dan laporan kemajuan
- As-built, O&M, sijil ujian, waranti dan rekod serahan

PRINSIP ESCALATION **Hentikan kerja → jadikan kawasan selamat → maklum Penyelia Tapak / JPS → rekod → sambung selepas pelepasan**

06

Pengurusan Risiko Projek

Daftar risiko indikatif daripada Cadangan Pelaksanaan; semak dan kemas kini dalam mesyuarat tapak

TINGGI	**Gangguan operasi pejabat**	Kerja berfasa, penghadang, notis awal dan kerja luar waktu pejabat dengan kelulusan.
TINGGI	**Kerosakan aset kerajaan**	Rekod keadaan asal, perlindungan fizikal, kawalan akses dan pemeriksaan harian.
SEDERHANA–TINGGI	**Keadaan tersembunyi / percanggahan tapak**	Pemeriksaan awal, foto, RFI dan arahan bertulis sebelum tindakan.
TINGGI	**Kemalangan atau kebakaran**	JSA, PPE, permit, penyeliaan dan akses kecemasan sentiasa bebas.
SEDERHANA	**Kelulusan bahan / bekalan lewat**	Submittal awal, senarai bahan kritikal dan pembekal alternatif yang diluluskan.
SEDERHANA	**Konflik seni bina, M&E dan ICT**	Selaras lukisan, periksa laluan perkhidmatan dan semak urutan kerja.
SEDERHANA–TINGGI	**Habuk, bunyi atau bau**	Pengasingan, kaedah rendah habuk, pembersihan dan jadual terkawal.
SEDERHANA	**Kecacatan kemasan akhir**	Pemeriksaan berperingkat, lindungi kemasan dan tutup snag sebelum serahan.

06

Komunikasi, Perubahan & Penyerahan

Aliran kawalan untuk keputusan, perubahan skop, ujian dan penutupan projek

KOMUNIKASI & PELAPORAN

Satu rekod tindakan

- Mesyuarat kemajuan bersama S.O. / wakil jabatan.
- Laporan meliputi kemajuan, aktiviti seterusnya, isu, risiko, bahan dan tenaga kerja.
- Pantau aktiviti kritikal dan sediakan pelan pemulihan jika lewat.
- Selaras akses pekerja, penghantaran dan kerja luar waktu.

PENGURUSAN PERUBAHAN

Arahan bertulis dahulu

- Rekod percanggahan lukisan, keadaan tersembunyi dan keperluan tambahan.
- Dapatkan arahan / kelulusan sebelum perubahan skop, bahan, kos atau tempoh.
- Gunakan RFI, rekod keputusan dan daftar perubahan.
- Jangan tutup kerja yang memerlukan pemeriksaan.

UJIAN, SERAHAN & DLP

Serah bukti, bukan kerja sahaja

- Sempurnakan ujian dan pentauliahan sistem dalam skop.
- Serah as-built, O&M, sijil ujian, waranti dan rekod bahan.
- Tutup defect list; bersih dan pulihkan kawasan.
- Serah kunci / kad akses dan beri sokongan sepanjang DLP.

03

Bon Pelaksanaan

Kadar dan nilai disahkan melalui Lampiran A Surat Setuju Terima

KAEDAH

Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP)

NILAI RASMI LAMPIRAN A • KADAR 5%

RM 44,550.00

NILAI DISAHKAN

SEMAKAN SELESAI

5% × RM 891,000.00 = RM 44,550.00

Nilai ini sepadan dengan butiran rasmi pada Lampiran A kontrak.

SYARAT & REKOD PENTADBIRAN

- Kaedah WJP digunakan seperti dinyatakan dalam bahan pembentangan projek.
- Bagi projek sehingga RM10 juta, tempoh bon dinyatakan hingga 12 bulan selepas tamat DLP.
- Rekod mekanisme potongan WJP dan simpan Lampiran A sebagai dokumen sokongan.

04

Insurans Projek

Butiran diambil daripada PDF pembentangan dalam dokumen2; polisi / cover note asal masih perlu disemak

INSURANS KERJA

SEMAK DOKUMEN ASAL

Contract Works / CAR

Syarikat insurans	Generali Insurance Malaysia Berhad
No. polisi	E6013278
Jumlah perlindungan	RM 891,000.00
Tempoh perlindungan	13 Nov 2026 – 12 Apr 2027

TANGGUNGAN AWAM

SEMAK TEMPOH

Public Liability

Syarikat insurans	Generali Insurance Malaysia Berhad
No. polisi	W6011251
Had indemniti	RM 200,000.00
Tempoh dalam PDF	13 Nov 2026 – 12 Apr 2027*

*** Lampiran A mensyaratkan Public Liability meliputi tempoh kontrak, DLP dan tambahan 3 bulan 14 hari. Sahkan tempoh pada polisi asal sebelum edaran akhir.**

05

Pendaftaran PERKESO (SOCSO)

Kod majikan disahkan melalui dokumen Registration dan Lampiran A kontrak

KOD MAJIKAN PERKESO

B3900006192K

NOMBOR DISAHKAN

Bukti caruman terkini dan senarai pekerja projek masih perlu dibawa untuk semakan.

DOKUMEN & REKOD SOKONGAN

01	**Kod majikan PERKESO**	B3900006192K — sepadan dalam dua dokumen sumber.
02	**No. pendaftaran KWSP**	018434199 — direkodkan dalam Lampiran A kontrak.
03	**Bukti caruman terkini**	Sediakan penyata untuk semakan mesyuarat.
04	**Pekerja, induksi & akses**	Padankan nama, ID, peranan dan tarikh induksi.

07

Carta Organisasi Projek

Pasukan teras, penyelia tapak dan Safety Site Supervisor telah dikenal pasti

PENGARAH PROJEK

Rashid Rahmat

DOKUMENTASI PROJEK

Siti Fatimah Ibrahim

PENGURUS PROJEK

Mohd Borhan Bin Said

PENYELIA TAPAK

Mohd Azahari Bin Taib

SAFETY SITE SUPERVISOR (SSS)

MUHAMMAD NOR SHAFIQ BIN ISMA

PASUKAN HSE / KESELAMATAN

Induksi • permit • rekod keselamatan

PENYELIA ID / RENOVASI

Penyelia subkontraktor / ketua tukang

PENYELIA M&E / ICT

Nama & kelayakan perlu disahkan

Surat Pelantikan Wakil Tapak Kontraktor

Calon wakil dikenal pasti; surat rasmi, nombor rujukan dan tarikh masih belum diterima

MA

WAKIL TAPAK / PENYELIA TAPAK

Mohd Azahari Bin Taib

SURAT RASMI DIPERLUKAN

BUTIRAN SURAT

No. rujukan	[SILA ISI]
Tarikh surat	[SILA ISI]
Tarikh kuat kuasa	13 November 2026 / sila sahkan

SKOP TANGGUNGJAWAB

- Menjadi titik hubungan harian antara kontraktor dan wakil JPS.
- Menyelaras pekerja, subkontraktor, akses, keselamatan dan housekeeping.
- Memastikan arahan, pemeriksaan, kemajuan dan isu tapak direkodkan.
- Mengesahkan kawasan selamat sebelum kerja ditutup atau diserahkan.

09

Cadangan Papan Tanda Projek

Konsep kandungan untuk semakan JPS sebelum fabrikasi

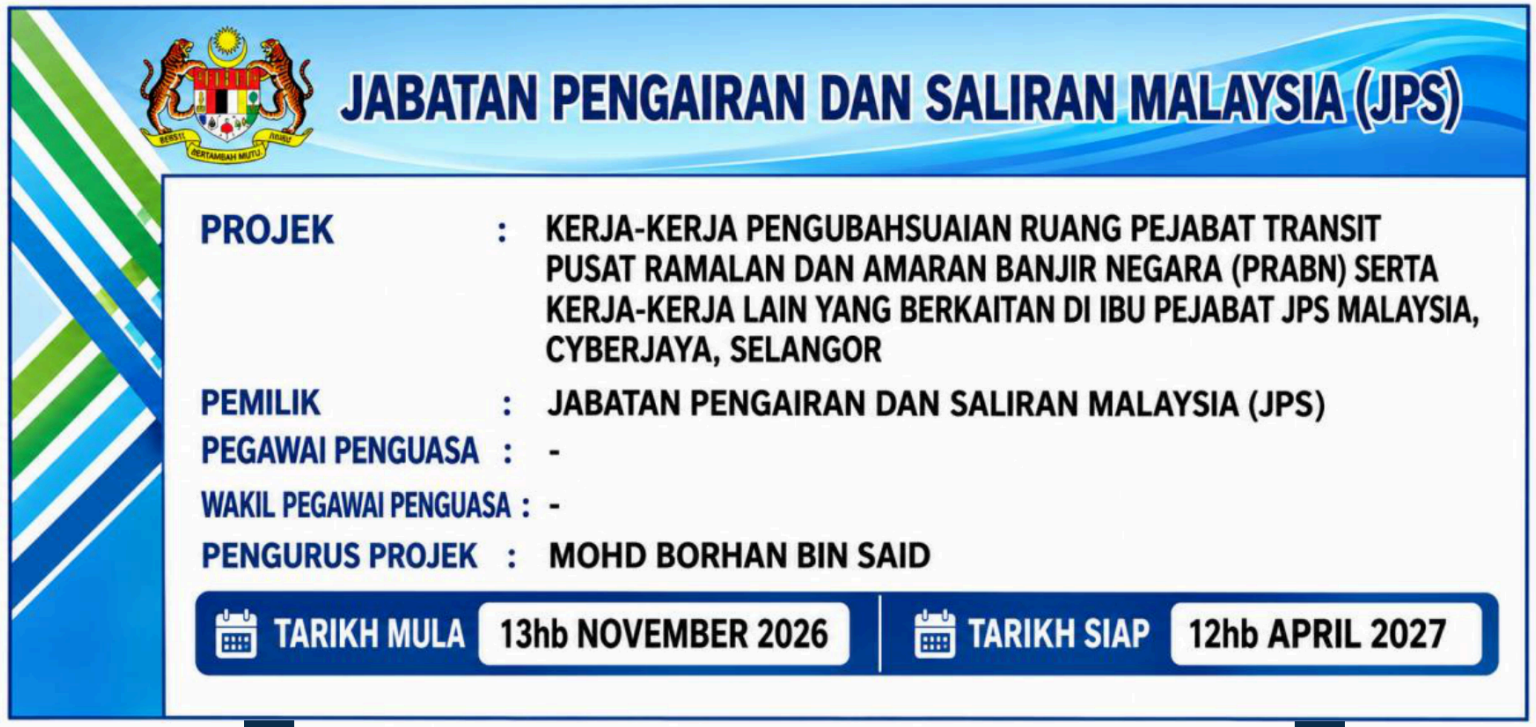

UNTUK PENGESAHAN

- Saiz dan lokasi pemasangan
- Format / templat rasmi JPS
- Nombor kontrak akhir
- Nama pegawai / bahagian
- Bahan, struktur dan kemasan
- Keperluan keselamatan tapak

TERTAKLUK KELULUSAN JPS

Status Kesediaan Mesyuarat

Semakan selepas menggabungkan semua dokumen, PDF NSC dan program kerja JPS

01	**Taklimat Pemilik Projek** Rangka keputusan tersedia	SEDIA	06	**Program & kaedah kerja** Kaedah, risiko, QA dan DLP dimasukkan	SEDIA
02	**Cadangan pelaksanaan** Dokumen cadangan telah digabungkan	SEDIA	07	**Carta organisasi** Nama / kelayakan sokongan belum lengkap	SEMAK
03	**Bon Pelaksanaan** Nilai rasmi RM44,550.00	SEDIA	08	**Surat wakil tapak** Surat rasmi masih diperlukan	TINDAKAN
04	**Insurans** Butiran ada; polisi dan tempoh perlu semak	SEMAK	09	**Papan tanda projek** Konsep menunggu kelulusan JPS	SEMAK
05	**PERKESO** Kod disahkan; bukti caruman diperlukan	SEMAK	10	**NSC & sijil kompetensi** Pendaftaran ada; sijil tamat tempoh perlu tindakan	SEMAK

Lengkapkan tindakan merah dan sahkan dokumen / kelulusan kuning sebelum versi akhir diedarkan.

Keputusan & Tindakan Selepas Mesyuarat

Tetapkan pemilik tindakan dan tarikh tutup bagi setiap perkara

KEPUTUSAN JPS

- [ ] Zon dan urutan kerja
- [ ] Waktu kerja / akses
- [ ] Tempoh kelulusan bahan
- [ ] Format papan tanda

DOKUMEN KONTRAKTOR

- [ ] Polisi / cover note asal
- [ ] Tempoh Public Liability
- [ ] Bukti caruman PERKESO
- [ ] Surat wakil tapak
- [ ] Sijil kompetensi aktif

TINDAKAN MOBILISASI

- [ ] Ukur bersama
- [ ] Induksi & permit
- [ ] Submittal pertama
- [ ] Laporan kemajuan

Sasaran pertama: tapak, akses, keselamatan dan submittal sedia sebelum 13 November 2026.

02A

Cadangan Pelaksanaan Projek

Profil projek dan asas perancangan pelaksanaan

PROJEK

KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT TRANSIT PUSAT RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA (PRABN) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI IBU PEJABAT JPS MALAYSIA, CYBERJAYA, SELANGOR

NO. KONTRAK

JPS/IP/SH/BBI/01/2026

TEMPOH SIAP

Lima (5) bulan
13 November 2026 – 12 April 2027

PEMILIK

Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

BAHAGIAN

Bahagian Bangunan dan Infrastruktur

LOKASI

Ibu Pejabat JPS Malaysia, Cyberjaya, Selangor

KONTRAKTOR

Ansar Technologies Sdn Bhd

Keadaan Operasi	Pejabat kekal beroperasi sepanjang tempoh kerja

02B

Struktur Cadangan Pelaksanaan

Empat belas bahagian daripada asas projek hingga penutupan

ASAS PROJEK

Tujuan dan skop

01 Pendahuluan

02 Objektif

03 Skop Kerja Cadangan

PELAKSANAAN

Kaedah dan sumber

04 Metodologi Kerja

05 Strategi Pelaksanaan Berfasa

06 Carta Organisasi & Tanggungjawab

07 Jadual Pelaksanaan — Lima Bulan

JAMINAN PELAKSANAAN

Kualiti, HSE dan risiko

08 Kawalan Kualiti

09 Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar

10 Pengurusan Risiko

TADBIR URUS & PENUTUPAN

Keputusan hingga DLP

11 Komunikasi & Pelaporan

12 Pengurusan Perubahan

13 Pengujian, Penyerahan & DLP

14 Penutup

Pendahuluan & Objektif

Asas pelaksanaan untuk tempoh kontrak lima bulan

PENDAHULUAN

Berfasa, terkawal dan gangguan minimum

Kerja pengubahsuaian dilaksanakan secara berfasa supaya operasi pejabat boleh diteruskan sepanjang tempoh lima bulan.

Semua kerja mematuhi dokumen tender, BQ, lukisan diluluskan, spesifikasi teknikal, syarat kontrak dan arahan Pegawai Penguasa.

ASAS PELAKSANAAN

5	2	1
BULAN	ZON UTAMA	PROGRAM KERJA

01 Siap mengikut program

Menyiapkan kerja dalam tempoh kontrak lima bulan berdasarkan program yang diluluskan.

TEPAT MASA

02 Kekalkan operasi pejabat

Kawasan yang tidak terlibat kekal beroperasi dan sentiasa disahkan selamat.

OPERASI AKTIF

03 Lindungi pengguna & aset

Kakitangan, orang awam, dokumen, aset dan kemudahan kerajaan dilindungi.

SELAMAT

04 Patuh keperluan teknikal

Semua kerja mengikut BQ, lukisan, spesifikasi dan bahan yang telah diluluskan.

PATUH

05 Kawal prestasi tapak

Masa, kualiti, keselamatan, kebersihan, gangguan perkhidmatan dan sisa dikawal.

TERKAWAL

06 Serahan lengkap

Ruang bersih, selamat dan berfungsi diserah bersama dokumen ujian serta rekod.

LENGKAP

02D

Skop Kerja Cadangan

Skop muktamad dirujuk kepada BQ, lukisan dan spesifikasi tender

01 **Transfer & Installation Works**

02 **Aras 5 • Sayap Kanan • Blok A**

03 **Aras G • Blok D • Tadika**

AWALAN & KERJA MEMBUKA

Sediakan tapak sebelum membina

- Mobilisasi, pemeriksaan tapak, pengukuran, perlindungan aset dan pengasingan kawasan.
- Buka, tanggal atau roboh komponen sedia ada yang dikenal pasti dan diluluskan.

SENI BINA & KEMASAN

Lengkapkan ruang dan komponen

- Pembaikan permukaan, partition, pintu, siling, lantai dan mengecat.
- Kabinet, kaunter, perabot terbina, kelengkapan pejabat dan papan tanda.

M&E, ICT & PERALATAN

Selaras semua sistem

- Lampu, soket, pendawaian, papan agihan, penyaman udara dan pengudaraan.
- Kerja ICT, integrasi, peralatan pejabat, ujian dan pentauliahan.

PEMINDAHAN & SERAHAN

Inventori, pindah, pasang dan uji

- Pindah partition, workstation, carpet, roller blind dan barangan dari stor JPS Blok D.
- Pindah dan pasang rangka video wall serta peralatan dari JPS Ampang.
- Pemeriksaan kecacatan, pembersihan akhir dan penyerahan.

Metodologi Kerja • Bahagian I

Mobilisasi hingga kerja binaan dan kemasan

4.1 Mobilisasi & Perancangan

- Mesyuarat permulaan bersama S.O. / wakil jabatan.
- Pemeriksaan bersama, foto keadaan asal, ukuran, utiliti, akses dan aset dikekalkan.
- Program terperinci, pelan zon, jadual bahan, method statement, pelan pemeriksaan, keselamatan dan komunikasi.
- Kenal pasti laluan pekerja, penghantaran, stor, lokasi sisa dan akses kecemasan.

4.2 Pengasingan & Kesinambungan Operasi

- Bahagikan ruang kepada zon mengikut susun atur sebenar dan persetujuan jabatan.
- Pasang safety barrier, papan tanda, kawalan habuk dan kawalan akses.
- Laluan kecemasan, alat kebakaran, panel elektrik dan laluan pengguna kekal bebas.
- Kerja yang mengganggu operasi dibuat di luar waktu pejabat atau masa diluluskan.

4.3 Kerja Membuka & Perobohan

- Sahkan komponen dan semak perkhidmatan tersembunyi sebelum kerja.
- Lindungi perabot, dokumen, peralatan ICT, kemasan dan aset dikekalkan.
- Buka / roboh secara terkawal; asingkan bahan dan guna laluan sisa diluluskan.
- Bersihkan kawasan setiap hari tanpa menghalang operasi atau laluan kecemasan.

4.4 Kerja Binaan & Kemasan

- Sahkan ukuran dan setting-out sebelum partition, siling, lantai, pintu dan kabinet.
- Kemuka sampel, katalog dan data teknikal sebelum pembelian atau pemasangan.
- Ikut urutan teknikal dan periksa kerja tersembunyi sebelum ditutup.
- Lindungi kemasan siap dan baiki kecacatan sebelum pemeriksaan akhir.

02F

Metodologi II & Strategi Berfasa

Penyelarasan sistem, pelepasan zon dan urutan lima fasa

4.5

Kerja M&E dan ICT

- Selaras laluan perkhidmatan dengan susun atur seni bina.
- Gunakan personel kompeten mengikut keperluan teknikal dan keselamatan.
- Dapatkan kelulusan serta beri notis sebelum gangguan utiliti atau rangkaian.
- Laksana ujian dan pentauliahan serta rekod keputusan.

4.6

Pemeriksaan, Pembersihan & Pelepasan Zon

- Pemeriksaan dalaman sebelum pemeriksaan bersama S.O. / wakil jabatan.
- Sedia defect list, tetapkan pemilik dan rekod pembaikan.
- Bersihkan ruang, keluarkan perlindungan sementara dan pulihkan akses.
- Zon digunakan semula selepas pemeriksaan keselamatan dan persetujuan jabatan.

FASA 01

Persediaan

Mobilisasi, ukur, perlindungan aset, zon dan kelulusan bahan

FASA 02

Buka & Bina

Kerja membuka, binaan, M&E dan kemasan

FASA 03

Periksa & Lepas

Zon diperiksa dan dilepaskan dengan persetujuan jabatan

FASA 04

Ulang Kawalan

Kawalan dan pemeriksaan yang sama bagi zon berikutnya

FASA 05

Integrasi & Serah

Ujian, pentauliahan, pembersihan dan penyerahan

Pemindahan sementara kakitangan, perabot atau peralatan diselaras dengan jabatan. Jika pengasingan zon tidak praktikal, pelan alternatif mesti diluluskan sebelum kerja.

06A

Organisasi, Jadual & Kawalan Kualiti

Peranan, kekangan program dan bukti QA/QC yang diperlukan

ORGANISASI & TANGGUNGJAWAB

Rantaian penyelarasan

S.O. / Wakil Jabatan
Pantau kontrak, beri arahan, selaras operasi dan terima kerja.

Pengurus Projek
Selaras masa, sumber, kemajuan, komunikasi, penyeliaan harian, urutan, tenaga kerja dan kebersihan.

Health & Safety Supervisor
Risiko/JSA, taklimat, PPE, pemeriksaan dan rekod insiden.

Penyelaras Keselamatan
Penilaian risiko, taklimat, PPE dan rekod keselamatan.

Supervisor M&E / ICT
Bahan, pemasangan, ujian dan pemantauan pekerja.

Supervisor ID
Penyelarasan teknikal, kemasan, pemasangan dan pekerja.

Penyelia Subkontraktor / Ketua Tukang
Kerja mengikut kepakaran, spesifikasi dan keselamatan.

JADUAL PELAKSANAAN

5

BULAN

Aktiviti bertindih hanya apabila urutan teknikal, akses, keselamatan dan kelulusan membenarkan.

Program terperinci dikemas kini selepas kuantiti dan keadaan tapak disahkan.

PROGRAM INDIKATIF

KAWALAN KUALITI

Rekod sebelum kerja ditutup

- Kelulusan bahan, checklist dan rekod pemeriksaan bagi setiap kerja.
- Bahan sepadan dengan kelulusan; simpan katalog, sijil dan rekod penghantaran.
- Periksa bahan masuk, kerja dalam proses dan kerja siap.
- Periksa pendawaian, paip dan rangka siling sebelum ditutup.
- Rekod NCR, tindakan pembetulan dan pengesahan penutupan.
- Rekod arahan, kelulusan, keputusan ujian dan pemeriksaan bersama.
- Jangan tutup kerja sebelum pemeriksaan / kelulusan berkaitan.

06B

Keselamatan & Pengurusan Risiko

Kawalan HSE dan daftar risiko indikatif untuk dikemas kini di tapak

HSE • KESELAMATAN, KESIHATAN & ALAM SEKITAR

Kawasan kerja terkawal

- PPE, penghadang, papan tanda, kawalan akses dan penyeliaan tapak.
- Permit / prosedur bagi kerja tinggi, kerja panas, pengangkatan dan kerja elektrik.
- Laluan kecemasan dan akses peralatan kebakaran sentiasa bebas.
- Kawal habuk, bunyi, bau dan getaran dengan pengasingan serta jadual terkawal.
- Asing dan lupus sisa di lokasi dibenarkan; jangan buang ke saliran.
- Lapor kemalangan, kejadian hampir cemas dan kerosakan aset segera.

DAFTAR RISIKO INDIKATIF

Risiko, tahap dan langkah kawalan

RISIKO	TAHAP	LANGKAH KAWALAN
Gangguan operasi pejabat	TINGGI	Kerja berfasa, penghadang, notis awal dan kerja luar waktu dengan kelulusan.
Keadaan tersembunyi / percanggahan	SED.–TINGGI	Pemeriksaan awal, foto, RFI dan arahan bertulis.
Kelulusan bahan / bekalan lewat	SEDERHANA	Submittal awal, bahan kritikal dan pembekal alternatif diluluskan.
Konflik seni bina, M&E & ICT	SEDERHANA	Selaras lukisan, laluan perkhidmatan dan urutan kerja.
Kerosakan aset kerajaan	TINGGI	Rekod asal, perlindungan, kawalan akses dan pemeriksaan harian.
Habuk, bunyi atau bau	SED.–TINGGI	Pengasingan, kaedah rendah habuk, pembersihan dan jadual terkawal.
Kemalangan / kebakaran	TINGGI	JSA, PPE, permit, penyeliaan dan akses kecemasan bebas.
Kecacatan kemasan akhir	SEDERHANA	Pemeriksaan berperingkat, perlindungan dan snagging.

06C

Komunikasi, Perubahan & DLP

Pelaporan, arahan bertulis, pengujian dan penyerahan lengkap

11.0 • KOMUNIKASI & PELAPORAN

Maklumat tepat pada waktunya

- Mesyuarat kemajuan bersama S.O. / wakil jabatan.
- Laporan merangkumi kemajuan, aktiviti seterusnya, isu, risiko, bahan, tenaga kerja dan tindakan susulan.
- Pantau aktiviti kritikal dan sediakan pelan pemulihan jika lewat.
- Dapatkan arahan bertulis bagi perubahan skop, bahan gantian dan gangguan utiliti.
- Selaras akses pekerja, penghantaran dan kerja luar waktu dengan wakil jabatan.

12.0 • PENGURUSAN PERUBAHAN

Tiada perubahan tanpa kuasa

- Rekod percanggahan lukisan, keadaan tersembunyi atau keperluan tambahan.
- Maklumkan perkara tersebut kepada S.O. / wakil yang diberi kuasa.
- Dapatkan arahan bertulis dan kelulusan sebelum melaksanakan perubahan.
- Nilai kesan terhadap skop, kos dan tempoh sebelum tindakan.

Semua perubahan mesti mematuhi prosedur kontrak.

13.0 • PENGUJIAN, PENYERAHAN & DLP

Bukti lengkap semasa serahan

- Sempurnakan kerja, ujian dan pentauliahan sistem dalam skop.
- Serah as-built, O&M, sijil ujian, waranti, rekod bahan dan kelulusan.
- Pemeriksaan bersama, defect list dan penutupan kecacatan.
- Bersihkan ruang, keluarkan peralatan dan pulihkan kawasan.
- Serah kunci, kad akses atau item berkaitan melalui rekod.
- Beri kerjasama sepanjang Tempoh Tanggungan Kecacatan.

10A

Pendaftaran & Sijil Syarikat

Gabungan dokumen dalam folder dokumen dan pembentangan NSC

SSM — SYARIKAT

Pendaftaran Syarikat

940482-W / 201101012342

Ansar Technologies Sdn Bhd

DISAHKAN

MOF — KEWANGAN

Sijil Akuan Pendaftaran

K63628406804588584

Rujukan 357-02174440
Sah: 26 Ogos 2026 – 27 Oktober 2029

AKTIF

BUMI — MOF

Taraf Bumiputera

BP63628406804588584

Rujukan 357-02174440
Sah: 26 Ogos 2026 – 27 Oktober 2029

AKTIF

CIDB — KONTRAKTOR

Perakuan Pendaftaran G3

0120130416-SL149730

Kategori B, CE dan ME
Sah: 23 Julai 2026 – 25 November 2029

AKTIF

ST — ELEKTRIK

Kontraktor Elektrik Kelas B

ST(TKL)SGR/C/KE/03491/2020

Dikeluarkan 4 Mac 2026
Tamat: 3 Mac 2031

AKTIF

PERKESO — MAJIKAN

Kod Majikan

B3900006192K

Nombor disahkan; penyata caruman terkini masih perlu dibawa.

SEMAK CARUMAN

10B

Nominated Sub-Contractor (NSC)

Subkontraktor pakar yang dikenal pasti dalam pembentangan sumber

E

Elektrik

Ansar Technologies Sdn Bhd

CIDB G3	Suruhanjaya Tenaga
E11 • E04	**Kelas B**

Pemasangan dan penyelarasan kerja elektrik disokong oleh seorang Penjaga Jentera A1 dan dua Pendawai PW4.

M

Mekanikal

Ansar Technologies Sdn Bhd

CIDB G3	Status Perakuan
M02	**Aktif**

Pakej mekanikal merangkumi penyelarasan, pemasangan, ujian dan pentauliahan sistem berkaitan.

ICT

Teknologi Maklumat

Ansar Technologies Sdn Bhd

CIDB G3	Personel Utama
E07 • E14	**Tc. Rashid Rahmat**

Pakej ICT meliputi rangkaian, integrasi, pelabelan, pengujian dan pemindahan sistem video wall.

Sahkan pelantikan, skop tanggungjawab dan dokumen sokongan NSC dengan S.O. kerana pembentangan sumber menamakan Ansar bagi ketiga-tiga pakej.

10C

NSC Elektrik & Orang Kompeten

Pendaftaran syarikat dan personel yang dinamakan dalam sijil Suruhanjaya Tenaga

CIDB MALAYSIA

G3 • Pengkhususan E11 dan E04

No. pendaftaran: 0120130416-SL149730
Tempoh: 23 Julai 2026 – 25 November 2029

SURUHANJAYA TENAGA

Kontraktor Elektrik • Kelas B

No. pendaftaran: ST(TKL)SGR/C/KE/03491/2020
Tempoh: 4 Mac 2026 – 3 Mac 2031

MA

Muhammad Azri Zakwan Bin Zulkifli

Penjaga Jentera • A1

No. perakuan	PJ 12101662
Tarikh sijil	19 Februari 2024
Sekatan	Sistem Voltan Rendah

SEMAK STATUS ST

AH

Ahmad Noor Hishamuddin Bin Abu Hassan

Pendawai • PW4

No. perakuan	PW 10500186
Tarikh sijil	21 Mac 2005
Skop	Tiga fasa & endorsan pengujian

SEMAK STATUS ST

NI

Naufal Iman Bin Kamarozaman

Pendawai • PW4

No. perakuan	PW 12104655
Tarikh sijil	26 Mac 2025
Skop	Tiga fasa & endorsan pengujian

SEMAK STATUS ST

10D

NSC Mekanikal & ICT

Pengkhususan CIDB yang ditandakan dalam dokumen NSC

SUBKONTRAKTOR PAKAR

Mekanikal

Ansar Technologies Sdn Bhd

CIDB G3 | M02

No. pendaftaran	**0120130416-SL149730**
Mula berkuat kuasa	**23 Julai 2026**
Tamat perakuan	**25 November 2029**
Status	**Aktif**

Penyelarasan teknikal, bahan, pemasangan, ujian dan pemantauan kerja mekanikal.

SUBKONTRAKTOR PAKAR

ICT

Ansar Technologies Sdn Bhd

CIDB G3 | E07 | E14

No. pendaftaran	**0120130416-SL149730**
Mula berkuat kuasa	**23 Julai 2026**
Tamat perakuan	**25 November 2029**
Status	**Aktif**

Rangkaian, integrasi, pelabelan, ujian serta pemindahan rangka dan peralatan video wall.

Perakuan CIDB yang sama digunakan bagi syarikat; kod yang diserlahkan dalam pembentangan sumber membezakan pakej Mekanikal dan ICT.

Orang Kompeten ICT & Status Sijil

Semakan nama, bidang, tarikh dan tempoh sijil dalam dokumen NSC

RR

PERSONEL ICT

Tc. Rashid Rahmat

Pengarah Projek

Bidang: Telecommunication & Broadcasting Technology serta rangkaian.

Maklumat pengenalan peribadi tidak dipaparkan dalam slaid.

MBOT — JURUTEKNIK

Juruteknik Berkelayakan

No. perakuan: QT25100099

Bidang: Telecommunication & Broadcasting Technology (TB)

Lulus mulai: 8 Oktober 2025

SEMAK PEMBAHARUAN

TM — RANGKAIAN

Certificate of Proficiency

No. siri: e2C00181606

Bidang: 2(C) — Rangkaian

Tempoh: 23 Julai 2024 – 22 Julai 2029

AKTIF

COMMSCOPE — KABEL

ND3801 • NETCONNECT ACT I

No. sijil: BG659082MY201AC4

Dikeluarkan: 8 Januari 2018

Sijil menyatakan tempoh tiga tahun daripada tarikh dikeluarkan.

TAMAT 8 JAN 2021

COMPTIA — NETWORK+

CompTIA Network+ Certified CE

Tarikh pensijilan: 9 April 2019

Tarikh tamat: 26 April 2022

Perlu sijil pembaharuan jika hendak digunakan sebagai kompetensi semasa.

TAMAT TEMPOH

10F

Sijil Syarikat • CIDB & Suruhanjaya Tenaga

Salinan sijil sebenar yang diekstrak daripada pembentangan NSC

CIDB MALAYSIA

AKTIF

Perakuan Pendaftaran • E11 & E04

CIDB MALAYSIA

PERAKUAN PENDAFTARAN

Adalah dengan ini diperakui bahawa kontraktor yang dinyatakan di bawah ini telah berdaftar dengan Lembaga mengikut Bahagian VI Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994. Pendaftaran ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan bersama perakuan ini.

No. Pendaftaran	:	0120130416-SL149730
Nama Kontraktor	:	ANSAR TECHNOLOGIES SDN. BHD.
Alamat Berdaftar	:	B2-1-34, TINGKAT 1 JALAN PINGGIRAN 1/3 TAMAN PINGGIRAN PUTRA 43300 SERI KEMBANGAN SELANGOR
Daerah	:	PETALING
Tarikh Mula Berdaftar	:	16/04/2013

0120130416-SL149730

Klik imej untuk paparan penuh

SURUHANJAYA TENAGA

AKTIF

Kontraktor Elektrik • Kelas B

ST(TKL)SGR/C/KE/03491/2020 NO: 2026/00748

BORANG Q
(peraturan 75)

AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ELEKTRIK

Mengikut peraturan 75 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

ANSAR TECHNOLOGIES SDN BHD
(nama syarikat)

dan memberi kuasa kepada pemegang untuk menjalankan perniagaan kerja elektrik sebagai Kontraktor Elektrik di :

B2-1-34 JALAN PINGGIRAN PUTRA 1/3
TAMAN PINGGIRAN PUTRA
43300 SRI KEMBANGAN
SELANGOR
(alamat perniagaan dan cawangan)

di bawah kelas :

[X] B [X] [X]

selama tempoh 5 tahun** dari tarikh dikeluarkan yang ditunjukkan di :

Tarikh dikeluarkan : **04/03/2026**
Tarikh Habis Tempoh : **03/03/2031**
No. Pendaftaran : **ST(TKL)SGR/C/KE/03491/2020**
Fi RM : **5,500.00**

ZUL AZRI BIN HAMIDON
Suruhanjaya Tenaga

ST(TKL)SGR/C/KE/03491/2020

Tamat 3 Mac 2031

10G

Sijil Orang Kompeten Elektrik

Seorang Penjaga Jentera A1 dan dua Pendawai PW4

PENJAGA JENTERA • A1

SEMAK ST

Muhammad Azri Zakwan Bin Zulkifli

Perakuan No. : PJ-T-2-B-0530-2024

No. : PJ 12101662

Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

BORANG M
(Peraturan 56)

SURUHANJAYA TENAGA

AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KEKOMPETENAN SEBAGAI PENJAGA JENTERA

MUHAMMAD AZRI ZAKWAN BIN ZULKIFLI
(Nama)

Kad Pengenalan No. : 020416140145 Tarikh Lahir : 16-04-2002

telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990, Perakuan Kekompetenan sebagai Penjaga Jentera ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.

KATEGORI : A1

SEKATAN, JIKA ADA : Sistem Voltan Rendah (Tanpa Stesen Janakuasa)

TEMPAT : Dikeluarkan - PUTRAJAYA
Melalui - KKTMPM

TARIKH : 19-02-2024

SURUHANJAYA PENGERUS MALAYSIA

PJ 12101662 19 Februari 2024

PENDAWAI • PW4

SEMAK ST

Ahmad Noor Hishamuddin Bin Abu Hassan

Perakuan No. : PW-T-4-B-0668- 2005

No. : PW 10500186

Suruhanjaya Tenaga

BORANG N
(Peraturan 56)

SURUHANJAYA TENAGA

AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KEKOMPETENAN SEBAGAI PENDAWAI

AHMAD NOOR HISHAMUDDIN BIN ABU HASSAN
(Nama)

Kad Pengenalan No. : 830421055185 Tarikh Lahir : 21-04-1983

telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990, Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.

KATEGORI : PW4

SEKATAN, JIKA ADA : Tiga Fasa & Endorsan Pengujian

TEMPAT : Dikeluarkan - KUALA LUMPUR
Melalui - IKBNDT

TARIKH : 21-03-2005

DATUK IR. (DR) MOHD ANNAS BIN HJ. MOHD NOR

PW 10500186 21 Mac 2005

PENDAWAI • PW4

SEMAK ST

Naufal Iman Bin Kamarozaman

Perakuan No. : PW-T-4-B-0602-2025

No. : PW 12104655

Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

BORANG N
(Peraturan 56)

SURUHANJAYA TENAGA

AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KEKOMPETENAN SEBAGAI PENDAWAI

NAUFAL IMAN BIN KAMAROZAMAN
(Nama)

Kad Pengenalan No. : 030628140381 Tarikh Lahir : 28-06-2003

telah diperiksa dan didapati memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 yang dibuat di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990, Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai ini dikeluarkan kepadanya dan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang lain.

KATEGORI : PW4

SEKATAN, JIKA ADA : Tiga Fasa & Endorsan Pengujian

TEMPAT : Dikeluarkan - PUTRAJAYA
Melalui - IKMJBH

TARIKH : 26-03-2025

SURUHANJAYA PENGERUS MALAYSIA

PW 12104655 26 Mac 2025

10H

Sijil CIDB • Mekanikal & ICT

Perakuan asal dengan pengkhususan pakej yang diserlahkan

CIDB • MEKANIKAL — AKTIF

Perakuan Pendaftaran G3 • M02

CIDB MALAYSIA

PERAKUAN PENDAFTARAN

Adalah dengan ini diperakui bahawa kontraktor yang dinyatakan di bawah ini telah berdaftar dengan Lembaga mengikut Bahagian VI Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994. Pendaftaran ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan bersama perakuan ini.

No. Pendaftaran	:	0120130416-SL149730
Nama Kontraktor	:	ANSAR TECHNOLOGIES SDN. BHD.
Alamat Berdaftar	:	B2-1-34, TINGKAT 1 JALAN PINGGIRAN 1/3 TAMAN PINGGIRAN PUTRA 43300 SERI KEMBANGAN SELANGOR
Daerah	:	PETALING
Tarikh Mula Berdaftar	:	16/04/2013

GRED	KATEGORI	PENGKHUSUSAN
G3	B	B04 B05 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B14 B15 B24 B28
G3	CE	CE01 CE06 CE08 CE10 CE14 CE19 CE20 CE21 CE31 CE36 CE42 CE43
G3	ME	E01 E02 E03 E06 E07 E08 E10 E11 E14 E16 E17 E21 M01 M02 M03 M04 M15 M20 M23

0120130416-SL149730 — Tamat 25 November 2029

CIDB • ICT — AKTIF

Perakuan Pendaftaran G3 • E07 & E14

CIDB MALAYSIA

PERAKUAN PENDAFTARAN

Adalah dengan ini diperakui bahawa kontraktor yang dinyatakan di bawah ini telah berdaftar dengan Lembaga mengikut Bahagian VI Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994. Pendaftaran ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan bersama perakuan ini.

No. Pendaftaran	:	0120130416-SL149730
Nama Kontraktor	:	ANSAR TECHNOLOGIES SDN. BHD.
Alamat Berdaftar	:	B2-1-34, TINGKAT 1 JALAN PINGGIRAN 1/3 TAMAN PINGGIRAN PUTRA 43300 SERI KEMBANGAN SELANGOR
Daerah	:	PETALING
Tarikh Mula Berdaftar	:	16/04/2013

GRED	KATEGORI	PENGKHUSUSAN
G3	B	B04 B05 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B14 B15 B24 B28
G3	CE	CE01 CE06 CE08 CE10 CE14 CE19 CE20 CE21 CE31 CE36 CE42 CE43
G3	ME	E01 E02 E03 E06 E07 E08 E10 E11 E14 E16 E17 E21 M01 M02 M03 M04 M15 M20 M23
G3	ME.	E04

0120130416-SL149730 — Tamat 25 November 2029

Sijil ICT • MBOT & CommScope

Salinan perakuan profesional dan latihan pemasangan kabel

MBOT

SEMAK PEMBAHARUAN

Juruteknik Berkelayakan • Tc. Rashid Rahmat

AKTA TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK 2015

PERATURAN-PERATURAN TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK (FI) 2017

No. Perakuan QT25100099

LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA

MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGISTS

LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA

PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI

JURUTEKNIK BERKELAYAKAN

INI ADALAH UNTUK MEMPERAKUI BAHAWA

Nama : RASHID BIN RAHMAT

No.Kad Pengenalan : 810909105547

Alamat : B2-1-34 JALAN PINGGIRAN 1/3 TAMAN PINGGIRAN PUTRA 43300 SERI KEMBANGAN SELANGOR MALAYSIA

Bidang Teknologi : TELECOMMUNICATION & BROADCASTING TECHNOLOGY (TB)

Yang telah mematuhi kehendak-kehendak Akta Teknologis dan Juruteknik 2015 didaftarkan sebagai seorang

QT25100099

Lulus mulai 8 Oktober 2025

COMMSCOPE INFRASTRUCTURE ACADEMY

TAMAT 8 JAN 2021

ND3801 • NETCONNECT ACT I

COMMSCOPE®

INFRASTRUCTURE ACADEMY

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This certifies that

RASHID BIN RAHMAT

ANSAR TECHNOLOGIES SDN BHD

has successfully completed

ND3801 - Installing Premises Cabling Systems NETCONNECT ACT I

James Donovan
Approval

8th January 2018
Date Issued

BG659082MY201AC4
Certificate

BICSI Recognized Continuing Education Credits (CECs)
9 Event ID: CV-COMMS-II-0616-1

This designation expires three (3) years from the date above

This is a training certificate. On its own, it does not infer or imply membership of the CommScope PartnerPRO™ Program or any other CommScope program. For further details visit www.commscope.com/PartnerPRO.

FM-106729-EN © 2018 CommScope, Inc. All rights reserved.

BG659082MY201AC4

Dikeluarkan 8 Januari 2018

Sijil ICT • TM & CompTIA

Salinan sijil kemahiran rangkaian dan pensijilan profesional

TM • CERTIFICATE OF PROFICIENCY — AKTIF

Bidang 2(C) Rangkaian • Rashid Bin Rahmat

NO. SIRI : e2C00181606

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
SIJIL KECEKAPAN

This certifies that / Dengan ini diperakukan bahawa :

RASHID BIN RAHMAT
810909105547

Is a proficient worker in the following skill area :
Adalah pekerja cekap dalam bidang kemahiran berikut :

Skill area / Bidang kemahiran :

2(C) - RANGKAIAN

For the following period / Untuk tempoh berikut :

From / Dari : 23 Jul 2024 To / Sehingga : 22 Jul 2029

e2C00181606 — 23 Julai 2024 – 22 Julai 2029

COMPTIA — TAMAT TEMPOH

Network+ Certified CE • Rashid Rahmat

CompTIA

Rashid Rahmat

has successfully completed the requirements to be recognized as

CompTIA Network+ CERTIFIED • CE

CompTIA Official Global Skill Certification — CERTIFIED

COMP001121486436
CANDIDATE ID
April 09, 2019
CERTIFICATION DATE
EXP DATE: 04/26/2022

TODD THIBODEAUX, PRESIDENT & CEO

Network+ Certified CE — Tamat 26 April 2022

PROGRAM KERJA WAJIB

Gantt Terperinci 1 daripada 3

Preliminaries, Transfer & Installation serta kerja Interior Design bagi Blok A dan Blok D.

TEMPOH
107 hari

ID AKTIVITI
1–50

MULA
13 Nov 2026

SIAP
12 Apr 2027

Transfer & Installation dijadualkan 23 November 2026 hingga 27 Januari 2027. Kerja ID Blok A berjalan hingga 9 April 2027.

JPS CYBERJAYA.pdf

Halaman asal 1 / 3 • Program bertarikh 29 Oktober 2026

Buka PDF program asal ↗

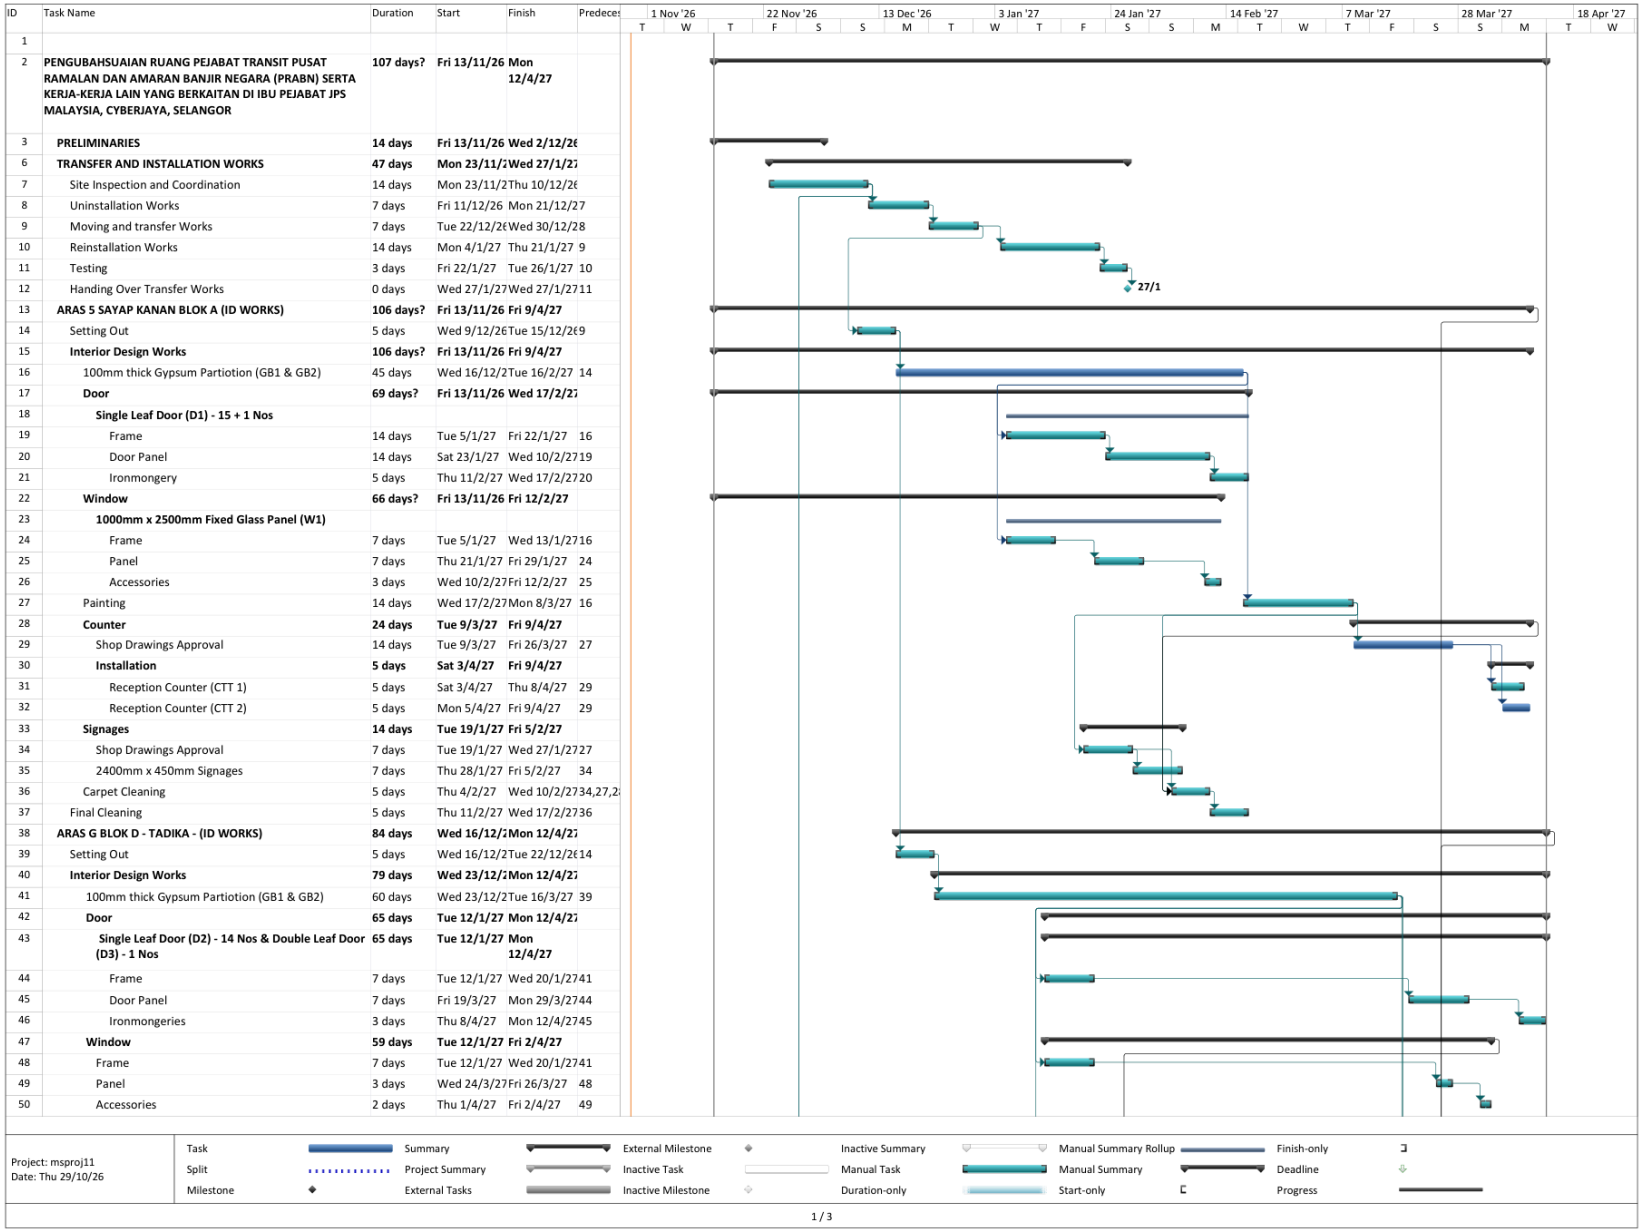

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predeces
1					
2	**PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT TRANSIT PUSAT RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA (PRABN) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI IBU PEJABAT JPS MALAYSIA, CYBERJAYA, SELANGOR**	**107 days?**	**Fri 13/11/26**	**Mon 12/4/27**	
3	**PRELIMINARIES**	**14 days**	**Fri 13/11/26**	**Wed 2/12/26**	
6	**TRANSFER AND INSTALLATION WORKS**	**47 days**	**Mon 23/11/2**	**Wed 27/1/27**	
7	Site Inspection and Coordination	14 days	Mon 23/11/2	Thu 10/12/26	
8	Uninstallation Works	7 days	Fri 11/12/26	Mon 21/12/27	
9	Moving and transfer Works	7 days	Tue 22/12/26	Wed 30/12/28	
10	Reinstallation Works	14 days	Mon 4/1/27	Thu 21/1/27	9
11	Testing	3 days	Fri 22/1/27	Tue 26/1/27	10
12	Handing Over Transfer Works	0 days	Wed 27/1/27	Wed 27/1/27	11
13	**ARAS 5 SAYAP KANAN BLOK A (ID WORKS)**	**106 days?**	**Fri 13/11/26**	**Fri 9/4/27**	
14	Setting Out	5 days	Wed 9/12/26	Tue 15/12/26	9
15	**Interior Design Works**	**106 days?**	**Fri 13/11/26**	**Fri 9/4/27**	
16	100mm thick Gypsum Partiotion (GB1 & GB2)	45 days	Wed 16/12/2	Tue 16/2/27	14
17	**Door**	**69 days?**	**Fri 13/11/26**	**Wed 17/2/27**	
18	**Single Leaf Door (D1) - 15 + 1 Nos**				
19	Frame	14 days	Tue 5/1/27	Fri 22/1/27	16
20	Door Panel	14 days	Sat 23/1/27	Wed 10/2/27	19
21	Ironmongery	5 days	Thu 11/2/27	Wed 17/2/27	20
22	**Window**	**66 days?**	**Fri 13/11/26**	**Fri 12/2/27**	
23	**1000mm x 2500mm Fixed Glass Panel (W1)**				
24	Frame	7 days	Tue 5/1/27	Wed 13/1/27	16
25	Panel	7 days	Thu 21/1/27	Fri 29/1/27	24
26	Accessories	3 days	Wed 10/2/27	Fri 12/2/27	25
27	Painting	14 days	Wed 17/2/27	Mon 8/3/27	16
28	**Counter**	**24 days**	**Tue 9/3/27**	**Fri 9/4/27**	
29	Shop Drawings Approval	14 days	Tue 9/3/27	Fri 26/3/27	27
30	**Installation**	**5 days**	**Sat 3/4/27**	**Fri 9/4/27**	
31	Reception Counter (CTT 1)	5 days	Sat 3/4/27	Thu 8/4/27	29
32	Reception Counter (CTT 2)	5 days	Mon 5/4/27	Fri 9/4/27	29
33	**Signages**	**14 days**	**Tue 19/1/27**	**Fri 5/2/27**	
34	Shop Drawings Approval	7 days	Tue 19/1/27	Wed 27/1/27	27
35	2400mm x 450mm Signages	7 days	Thu 28/1/27	Fri 5/2/27	34
36	Carpet Cleaning	5 days	Thu 4/2/27	Wed 10/2/27	34,27,2
37	Final Cleaning	5 days	Thu 11/2/27	Wed 17/2/27	36
38	**ARAS G BLOK D - TADIKA - (ID WORKS)**	**84 days**	**Wed 16/12/2**	**Mon 12/4/27**	
39	Setting Out	5 days	Wed 16/12/2	Tue 22/12/26	14
40	**Interior Design Works**	**79 days**	**Wed 23/12/2**	**Mon 12/4/27**	
41	100mm thick Gypsum Partiotion (GB1 & GB2)	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	39
42	**Door**	**65 days**	**Tue 12/1/27**	**Mon 12/4/27**	
43	**Single Leaf Door (D2) - 14 Nos & Double Leaf Door (D3) - 1 Nos**	**65 days**	**Tue 12/1/27**	**Mon 12/4/27**	
44	Frame	7 days	Tue 12/1/27	Wed 20/1/27	41
45	Door Panel	7 days	Fri 19/3/27	Mon 29/3/27	44
46	Ironmongeries	3 days	Thu 8/4/27	Mon 12/4/27	45
47	**Window**	**59 days**	**Tue 12/1/27**	**Fri 2/4/27**	
48	Frame	7 days	Tue 12/1/27	Wed 20/1/27	41
49	Panel	3 days	Wed 24/3/27	Fri 26/3/27	48
50	Accessories	2 days	Thu 1/4/27	Fri 2/4/27	49

PROGRAM KERJA WAJIB

Gantt Terperinci 2 daripada 3

Sambungan kerja ID Blok D, pakej mekanikal dan pakej elektrikal bagi kedua-dua lokasi.

ID AKTIVITI
51–100

MEKANIKAL
57 hari

ELEKTRIK
77 hari

LOKASI
Blok A & D

Merangkumi kabinet terbina, sanitary fittings, AHU, VSD, motor, FCU, distribution board, luminaires, pendawaian dan testing.

JPS CYBERJAYA.pdf

Halaman asal 2 / 3 • Semua turutan dan predecessor dikekalkan

Buka PDF program asal ↗

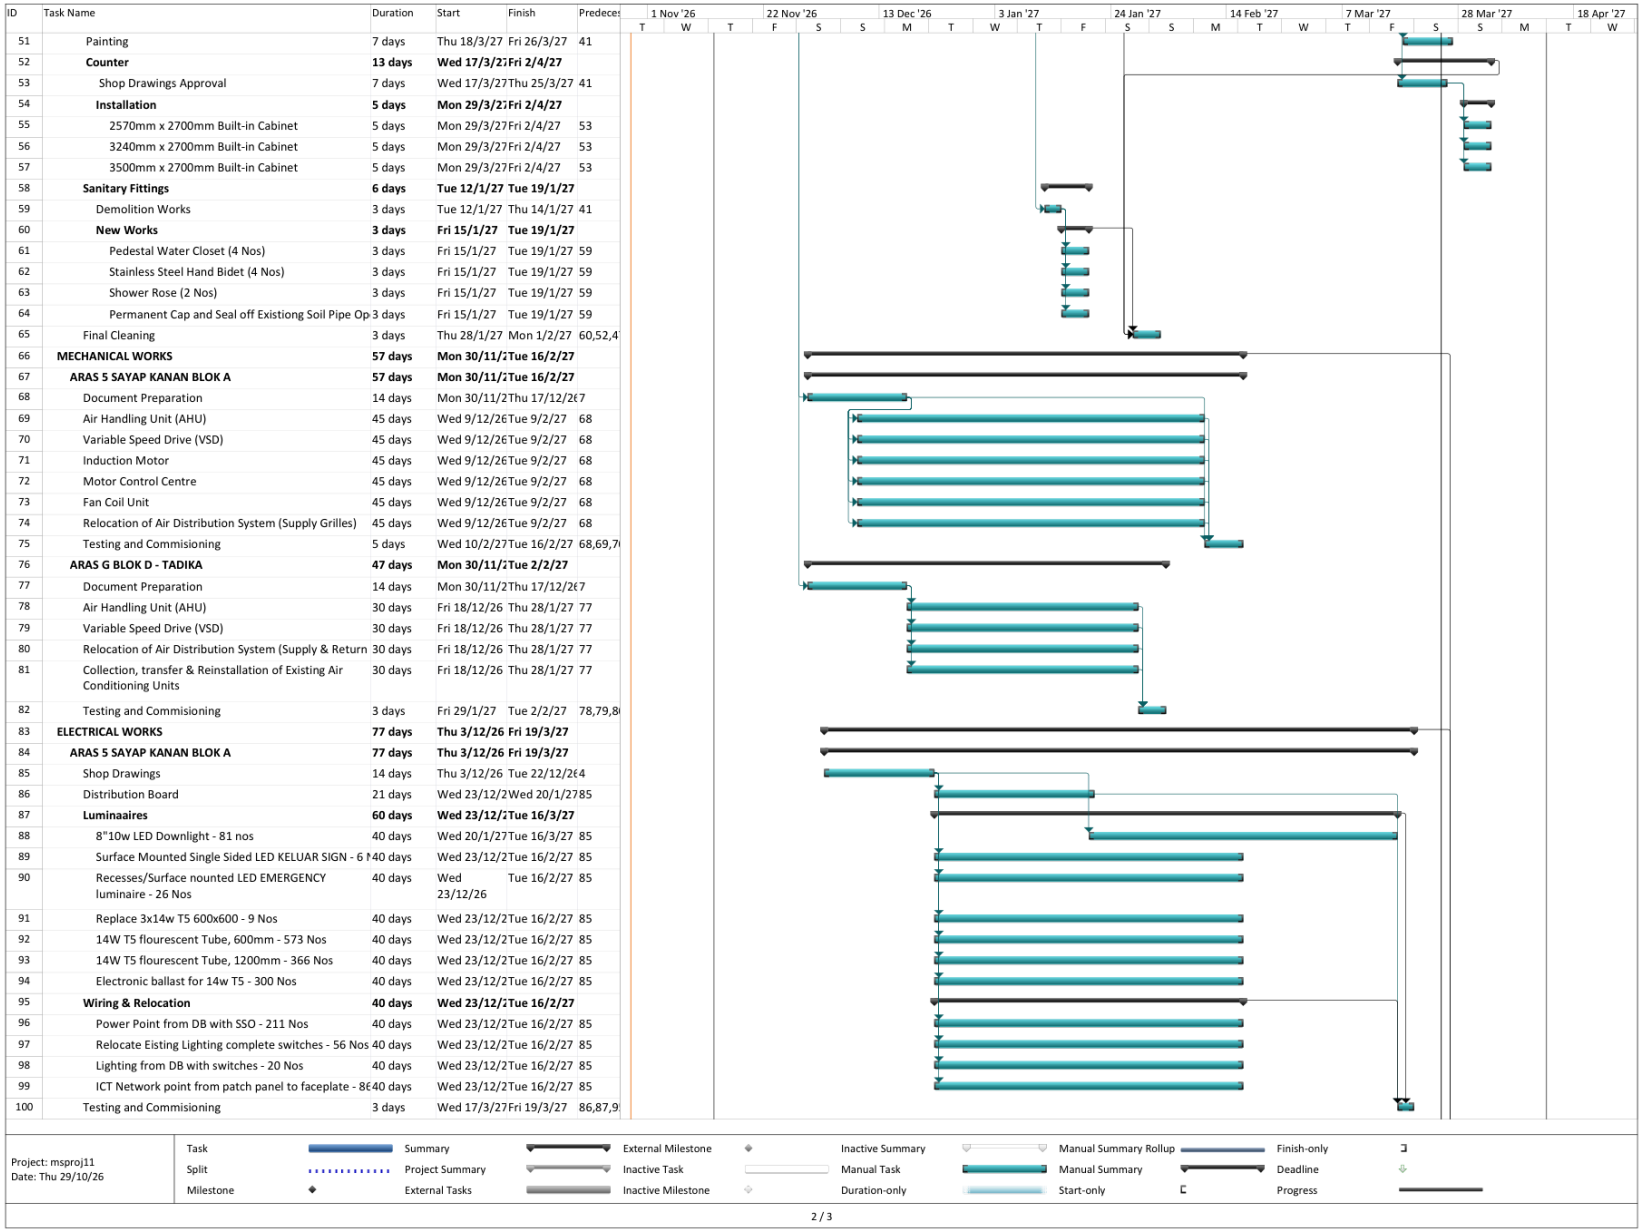

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predeces
51	Painting	7 days	Thu 18/3/27	Fri 26/3/27	41
52	**Counter**	**13 days**	**Wed 17/3/27**	**Fri 2/4/27**	
53	Shop Drawings Approval	7 days	Wed 17/3/27	Thu 25/3/27	41
54	**Installation**	**5 days**	**Mon 29/3/27**	**Fri 2/4/27**	
55	2570mm x 2700mm Built-in Cabinet	5 days	Mon 29/3/27	Fri 2/4/27	53
56	3240mm x 2700mm Built-in Cabinet	5 days	Mon 29/3/27	Fri 2/4/27	53
57	3500mm x 2700mm Built-in Cabinet	5 days	Mon 29/3/27	Fri 2/4/27	53
58	**Sanitary Fittings**	**6 days**	**Tue 12/1/27**	**Tue 19/1/27**	
59	Demolition Works	3 days	Tue 12/1/27	Thu 14/1/27	41
60	**New Works**	**3 days**	**Fri 15/1/27**	**Tue 19/1/27**	
61	Pedestal Water Closet (4 Nos)	3 days	Fri 15/1/27	Tue 19/1/27	59
62	Stainless Steel Hand Bidet (4 Nos)	3 days	Fri 15/1/27	Tue 19/1/27	59
63	Shower Rose (2 Nos)	3 days	Fri 15/1/27	Tue 19/1/27	59
64	Permanent Cap and Seal off Existiong Soil Pipe Op	3 days	Fri 15/1/27	Tue 19/1/27	59
65	Final Cleaning	3 days	Thu 28/1/27	Mon 1/2/27	60,52,4
66	**MECHANICAL WORKS**	**57 days**	**Mon 30/11/2**	**Tue 16/2/27**	
67	**ARAS 5 SAYAP KANAN BLOK A**	**57 days**	**Mon 30/11/2**	**Tue 16/2/27**	
68	Document Preparation	14 days	Mon 30/11/2	Thu 17/12/2	7
69	Air Handling Unit (AHU)	45 days	Wed 9/12/26	Tue 9/2/27	68
70	Variable Speed Drive (VSD)	45 days	Wed 9/12/26	Tue 9/2/27	68
71	Induction Motor	45 days	Wed 9/12/26	Tue 9/2/27	68
72	Motor Control Centre	45 days	Wed 9/12/26	Tue 9/2/27	68
73	Fan Coil Unit	45 days	Wed 9/12/26	Tue 9/2/27	68
74	Relocation of Air Distribution System (Supply Grilles)	45 days	Wed 9/12/26	Tue 9/2/27	68
75	Testing and Commisioning	5 days	Wed 10/2/27	Tue 16/2/27	68,69,7
76	**ARAS G BLOK D - TADIKA**	**47 days**	**Mon 30/11/2**	**Tue 2/2/27**	
77	Document Preparation	14 days	Mon 30/11/2	Thu 17/12/2	7
78	Air Handling Unit (AHU)	30 days	Fri 18/12/26	Thu 28/1/27	77
79	Variable Speed Drive (VSD)	30 days	Fri 18/12/26	Thu 28/1/27	77
80	Relocation of Air Distribution System (Supply & Return	30 days	Fri 18/12/26	Thu 28/1/27	77
81	Collection, transfer & Reinstallation of Existing Air Conditioning Units	30 days	Fri 18/12/26	Thu 28/1/27	77
82	Testing and Commisioning	3 days	Fri 29/1/27	Tue 2/2/27	78,79,8
83	**ELECTRICAL WORKS**	**77 days**	**Thu 3/12/26**	**Fri 19/3/27**	
84	**ARAS 5 SAYAP KANAN BLOK A**	**77 days**	**Thu 3/12/26**	**Fri 19/3/27**	
85	Shop Drawings	14 days	Thu 3/12/26	Tue 22/12/2	4
86	Distribution Board	21 days	Wed 23/12/2	Wed 20/1/27	85
87	**Luminaaires**	**60 days**	**Wed 23/12/2**	**Tue 16/3/27**	
88	8"10w LED Downlight - 81 nos	40 days	Wed 20/1/27	Tue 16/3/27	85
89	Surface Mounted Single Sided LED KELUAR SIGN - 6 N	40 days	Wed 23/12/2	Tue 16/2/27	85
90	Recesses/Surface nounted LED EMERGENCY luminaire - 26 Nos	40 days	Wed 23/12/26	Tue 16/2/27	85
91	Replace 3x14w T5 600x600 - 9 Nos	40 days	Wed 23/12/2	Tue 16/2/27	85
92	14W T5 flourescent Tube, 600mm - 573 Nos	40 days	Wed 23/12/2	Tue 16/2/27	85
93	14W T5 flourescent Tube, 1200mm - 366 Nos	40 days	Wed 23/12/2	Tue 16/2/27	85
94	Electronic ballast for 14w T5 - 300 Nos	40 days	Wed 23/12/2	Tue 16/2/27	85
95	**Wiring & Relocation**	**40 days**	**Wed 23/12/2**	**Tue 16/2/27**	
96	Power Point from DB with SSO - 211 Nos	40 days	Wed 23/12/2	Tue 16/2/27	85
97	Relocate Eisting Lighting complete switches - 56 Nos	40 days	Wed 23/12/2	Tue 16/2/27	85
98	Lighting from DB with switches - 20 Nos	40 days	Wed 23/12/2	Tue 16/2/27	85
99	ICT Network point from patch panel to faceplate - 8	40 days	Wed 23/12/2	Tue 16/2/27	85
100	Testing and Commisioning	3 days	Wed 17/3/27	Fri 19/3/27	86,87,9

1 Nov '26 | 22 Nov '26 | 13 Dec '26 | 3 Jan '27 | 24 Jan '27 | 14 Feb '27 | 7 Mar '27 | 28 Mar '27 | 18 Apr '27

Project: msproj11
Date: Thu 29/10/26

Task | Summary | External Milestone | Inactive Summary | Manual Summary Rollup | Finish-only
Split | Project Summary | Inactive Task | Manual Task | Manual Summary | Deadline
Milestone | External Tasks | Inactive Milestone | Duration-only | Start-only | Progress

2 / 3

PROGRAM KERJA WAJIB

Gantt Terperinci 3 daripada 3

Kerja elektrikal Blok D, rangkaian ICT, testing, pembersihan akhir dan penyerahan.

ID AKTIVITI
101–147

ICT
78 hari

T&C
26 Mac–6 Apr

HAND OVER
12 Apr 2027

Final Cleaning dijadualkan 3 hingga 12 April 2027.
Milestone Hand Over ditetapkan pada 12 April 2027.

JPS CYBERJAYA.pdf

Halaman asal 3 / 3 • Penutup program kerja terperinci

Buka PDF program asal ↗

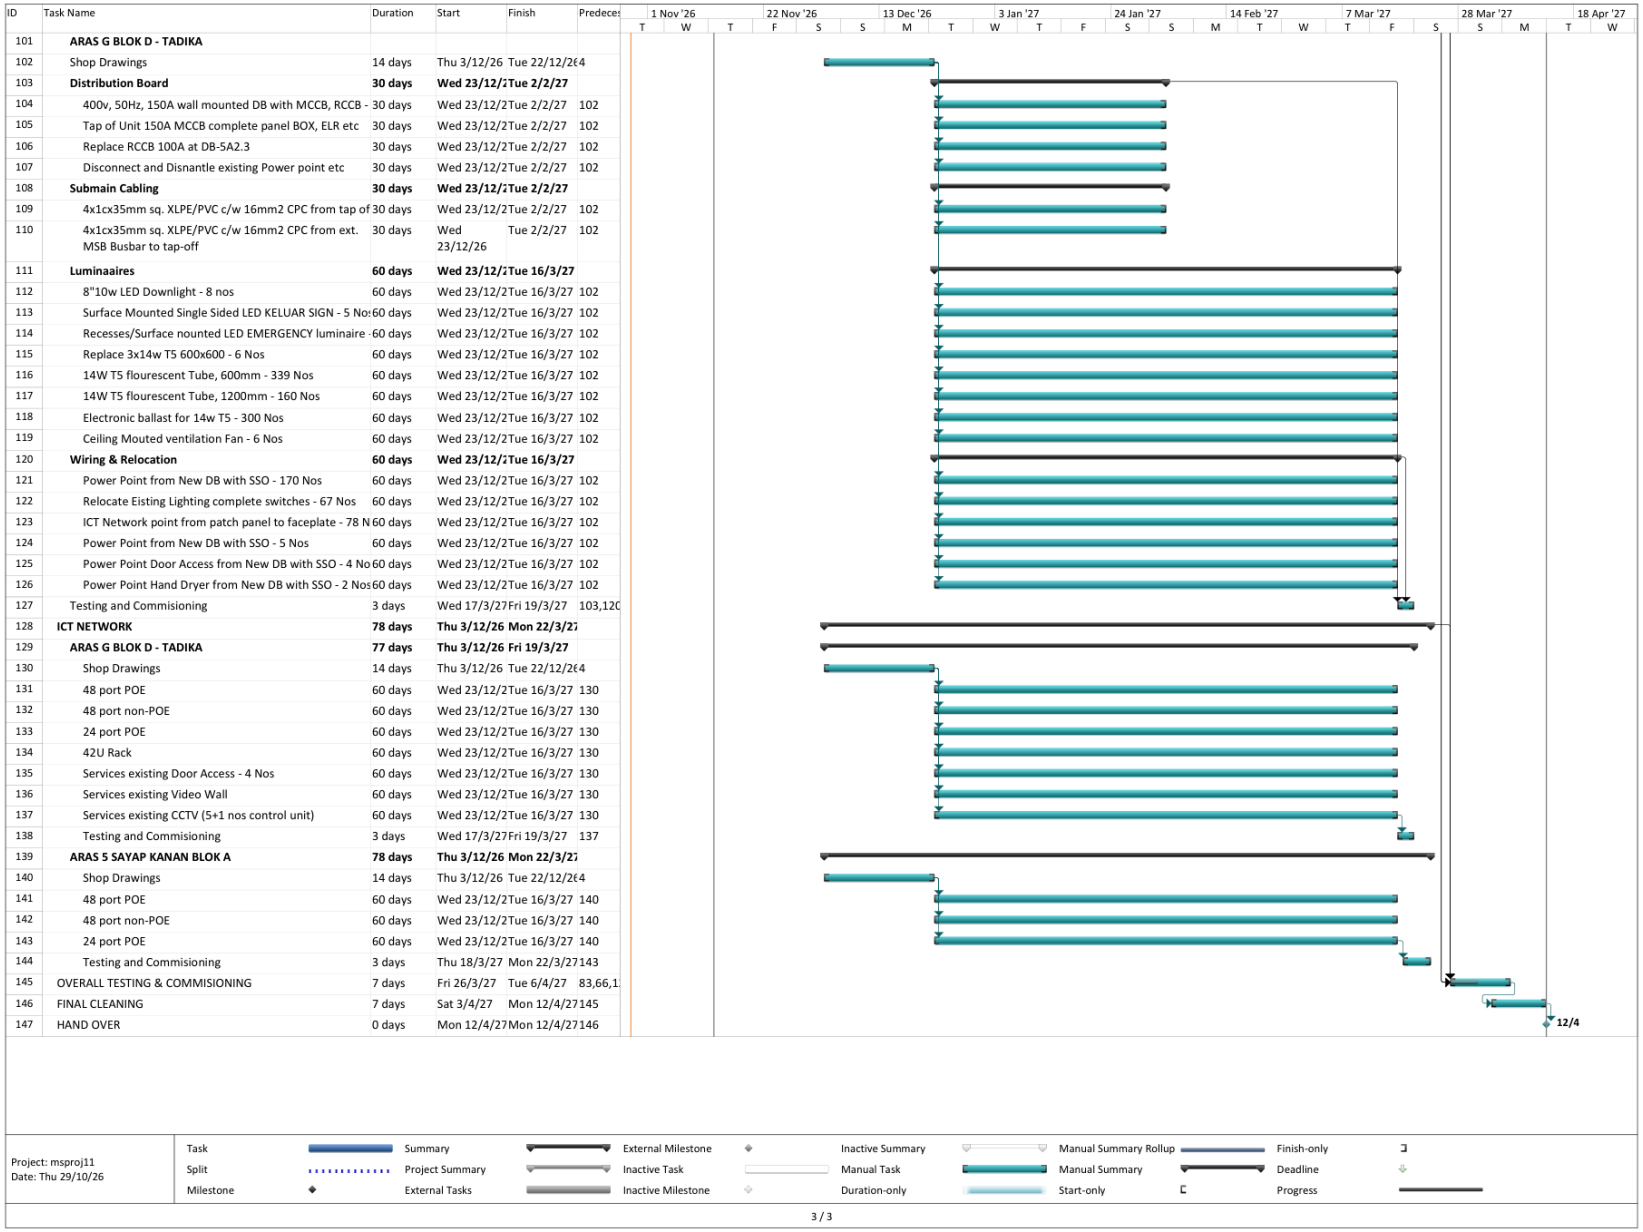

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predeces
101	**ARAS G BLOK D - TADIKA**				
102	Shop Drawings	14 days	Thu 3/12/26	Tue 22/12/26	4
103	**Distribution Board**	**30 days**	**Wed 23/12/2**	**Tue 2/2/27**	
104	400v, 50Hz, 150A wall mounted DB with MCCB, RCCB -	30 days	Wed 23/12/2	Tue 2/2/27	102
105	Tap of Unit 150A MCCB complete panel BOX, ELR etc	30 days	Wed 23/12/2	Tue 2/2/27	102
106	Replace RCCB 100A at DB-5A2.3	30 days	Wed 23/12/2	Tue 2/2/27	102
107	Disconnect and Disnantle existing Power point etc	30 days	Wed 23/12/2	Tue 2/2/27	102
108	**Submain Cabling**	**30 days**	**Wed 23/12/2**	**Tue 2/2/27**	
109	4x1cx35mm sq. XLPE/PVC c/w 16mm2 CPC from tap of	30 days	Wed 23/12/2	Tue 2/2/27	102
110	4x1cx35mm sq. XLPE/PVC c/w 16mm2 CPC from ext. MSB Busbar to tap-off	30 days	Wed 23/12/26	Tue 2/2/27	102
111	**Luminaaires**	**60 days**	**Wed 23/12/2**	**Tue 16/3/27**	
112	8"10w LED Downlight - 8 nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
113	Surface Mounted Single Sided LED KELUAR SIGN - 5 No	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
114	Recesses/Surface nounted LED EMERGENCY luminaire -	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
115	Replace 3x14w T5 600x600 - 6 Nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
116	14W T5 flourescent Tube, 600mm - 339 Nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
117	14W T5 flourescent Tube, 1200mm - 160 Nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
118	Electronic ballast for 14w T5 - 300 Nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
119	Ceiling Mouted ventilation Fan - 6 Nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
120	**Wiring & Relocation**	**60 days**	**Wed 23/12/2**	**Tue 16/3/27**	
121	Power Point from New DB with SSO - 170 Nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
122	Relocate Eisting Lighting complete switches - 67 Nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
123	ICT Network point from patch panel to faceplate - 78 N	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
124	Power Point from New DB with SSO - 5 Nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
125	Power Point Door Access from New DB with SSO - 4 No	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
126	Power Point Hand Dryer from New DB with SSO - 2 No	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	102
127	Testing and Commisioning	3 days	Wed 17/3/27	Fri 19/3/27	103,120
128	**ICT NETWORK**	**78 days**	**Thu 3/12/26**	**Mon 22/3/27**	
129	**ARAS G BLOK D - TADIKA**	**77 days**	**Thu 3/12/26**	**Fri 19/3/27**	
130	Shop Drawings	14 days	Thu 3/12/26	Tue 22/12/26	4
131	48 port POE	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	130
132	48 port non-POE	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	130
133	24 port POE	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	130
134	42U Rack	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	130
135	Services existing Door Access - 4 Nos	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	130
136	Services existing Video Wall	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	130
137	Services existing CCTV (5+1 nos control unit)	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	130
138	Testing and Commisioning	3 days	Wed 17/3/27	Fri 19/3/27	137
139	**ARAS 5 SAYAP KANAN BLOK A**	**78 days**	**Thu 3/12/26**	**Mon 22/3/27**	
140	Shop Drawings	14 days	Thu 3/12/26	Tue 22/12/26	4
141	48 port POE	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	140
142	48 port non-POE	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	140
143	24 port POE	60 days	Wed 23/12/2	Tue 16/3/27	140
144	Testing and Commisioning	3 days	Thu 18/3/27	Mon 22/3/27	143
145	OVERALL TESTING & COMMISIONING	7 days	Fri 26/3/27	Tue 6/4/27	83,66,1
146	FINAL CLEANING	7 days	Sat 3/4/27	Mon 12/4/27	145
147	HAND OVER	0 days	Mon 12/4/27	Mon 12/4/27	146

MEETING.STATUS / FINAL COMMITMENT

Penutup & Komitmen Pelaksanaan

Ansar Technologies komited melaksanakan pengubahsuaian ruang pejabat secara terancang, selamat dan terkawal dalam tempoh lima bulan, dengan keutamaan kepada kesinambungan operasi pejabat serta penyerahan mengikut program yang diluluskan.

01 Kesinambungan Operasi
Kerja berfasa dengan gangguan minimum kepada pejabat.

02 Keselamatan Pengguna & Pekerja
HSE, SSS, permit dan kawalan akses dilaksanakan.

03 Perlindungan Aset Kerajaan
Keadaan asal direkod, aset dilindungi dan dipantau.

04 Pematuhan Teknikal
Kerja mengikut BQ, lukisan, spesifikasi dan syarat kontrak.

05 Kualiti & Dokumentasi
Pemeriksaan, ujian, as-built, O&M dan waranti direkodkan.

06 Penyerahan Lengkap
Ruang bersih, selamat dan berfungsi diserah pada 12 April 2027.

DOCUMENT.PRECEDENCE **Cadangan ini dibaca bersama dokumen tender, BQ, lukisan, spesifikasi dan syarat kontrak. Jika terdapat percanggahan, dokumen kontrak serta arahan bertulis pihak berkuasa menjadi rujukan.**

TERIMA KASIH · SOAL JAWAB
